
BÀI SỐ 8

Câu 1: Sử dụng tệp **HUBT_QTDA_Bai8_PhanBietFreeSlack.mpp** (giáo viên cung cấp) thực hiện các yêu cầu sau

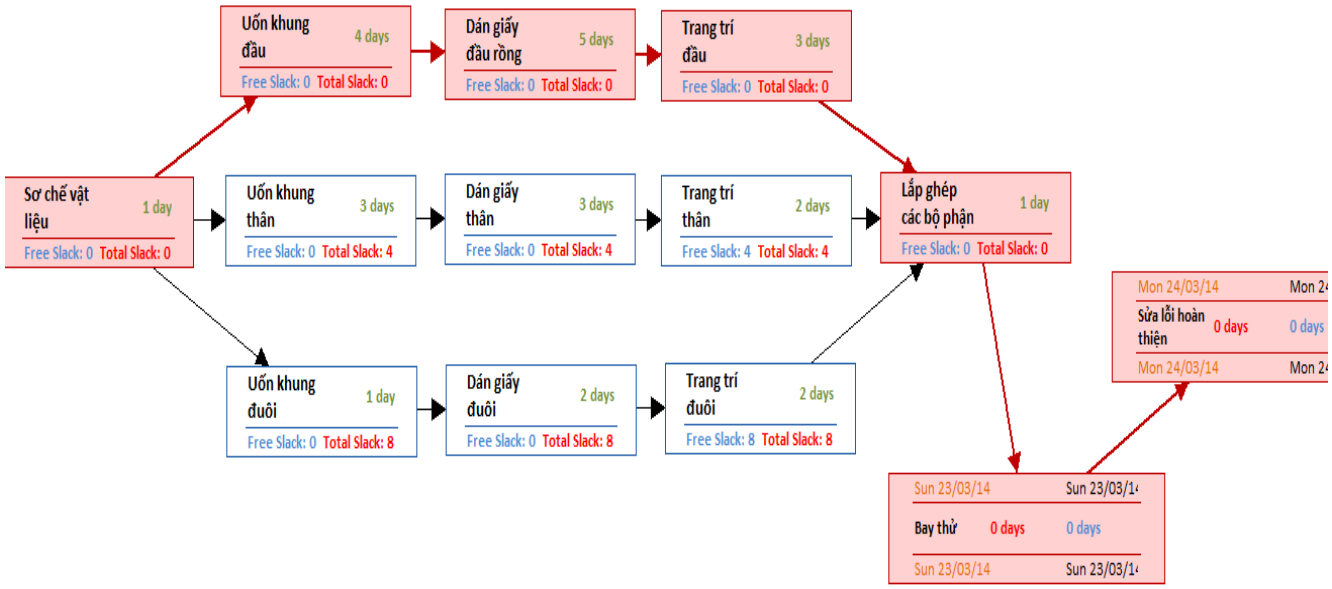

1. Định dạng đường găng như hình trên.
2. Tìm đường găng cho hình trên dựa vào Total Slack.
3. Trong hình vẽ, công việc "Trang trí thân" có Free Slack=4 có ý nghĩa gì? Giải thích?
4. Trong hình vẽ, công việc "Dán giấy thân" có Total Slack=4 có ý nghĩa gì? Giải thích?

Câu 2: Sử dụng tệp **HUBT_QTDA_Bai2_DuAnLamGom.mpp** (giáo viên cung cấp) thực hiện các yêu cầu sau

1. Thiết lập BASELINE để CHỤP lại kế hoạch hiện tại 1 bản.
2. Thiết lập STATUS DATE để xác định ngày giám sát dự án 23/5, hiển thị STATUS DATE thành đường vạch đỏ.
3. Cập nhật việc 2 xong 100%, việc 4 xong 75%, việc 6 xong 50%, việc 10 xong 25% bằng các nút bấm trên toolbar.
4. Cập nhật việc 11, 12, 16, 17 đúng tiến độ dự kiến (Mark on Track).
5. Cập nhật việc 13 không đúng tiến độ (Update Tasks) => Hoàn thành 80%, ghi chú "Bàn xoay hỏng, thiếu thạch cao", thời gian bắt đầu thực tế muộn 1 ngày, chưa biết ngày kết thúc.

6. Cập nhật tất cả các công việc xong đến ngày 23/5 cho mọi công việc còn lại (Project => Update Project).
7. Chuyển về view Task => Tracking Gantt để so sánh sự sai khác với kế hoạch ban đầu.
8. Xem chi phí, giờ công dự án đến thời điểm hiện tại, cho biết chi phí, giờ công còn lại.

Câu 3: Sử dụng phương pháp giám sát Earned Value (View/ Tables/ More Tables…/ Earned Value) thực hiện các yêu cầu trong bài tập sau (các công việc đều kéo dài 10 ngày, giám sát ở ngày thứ 3, chi phí 1 triệu/ngày)

	Task Name	Planned Value - PV (BCWS)	Earned Value - EV (BCWP)	AC (ACWP)	CPI	SPI	EAC
1	May áo gửi Hoàng Sa	3,000,000 đ	2,500,000 đ	2,400,000 đ	1.04	0.83	9,600,000 đ
2	Làm đèn gửi Trường Sa	3,000,000 đ	3,000,000 đ	1,333,333 đ	2.25	1	4,444,444 đ
3	Suất ăn gửi Hoàng Sa	3,000,000 đ	2,000,000 đ	1,750,000 đ	1.14	0.67	8,750,000 đ
4	Nước uống gửi Trường Sa	3,000,000 đ	2,500,000 đ	2,600,000 đ	0.96	0.83	10,400,000 đ
5	Áo mưa gửi Hoàng Sa	3,000,000 đ	4,000,000 đ	3,000,000 đ	1.33	1.33	7,500,000 đ

1. Công việc nào có khả năng chậm tiến độ?
2. Công việc nào có khả năng vượt mức chi phí? Dự báo vượt bao nhiêu?
3. Công việc nào có khả năng hoàn thành sớm?
4. Công việc nào có khả năng tiêu tốn chi phí ít hơn dự kiến?
5. Dự báo số ngày hoàn thành của công việc số 5?
